




**DETALHE CAIXA DE AREIA - CA**  
SEM ESCALA

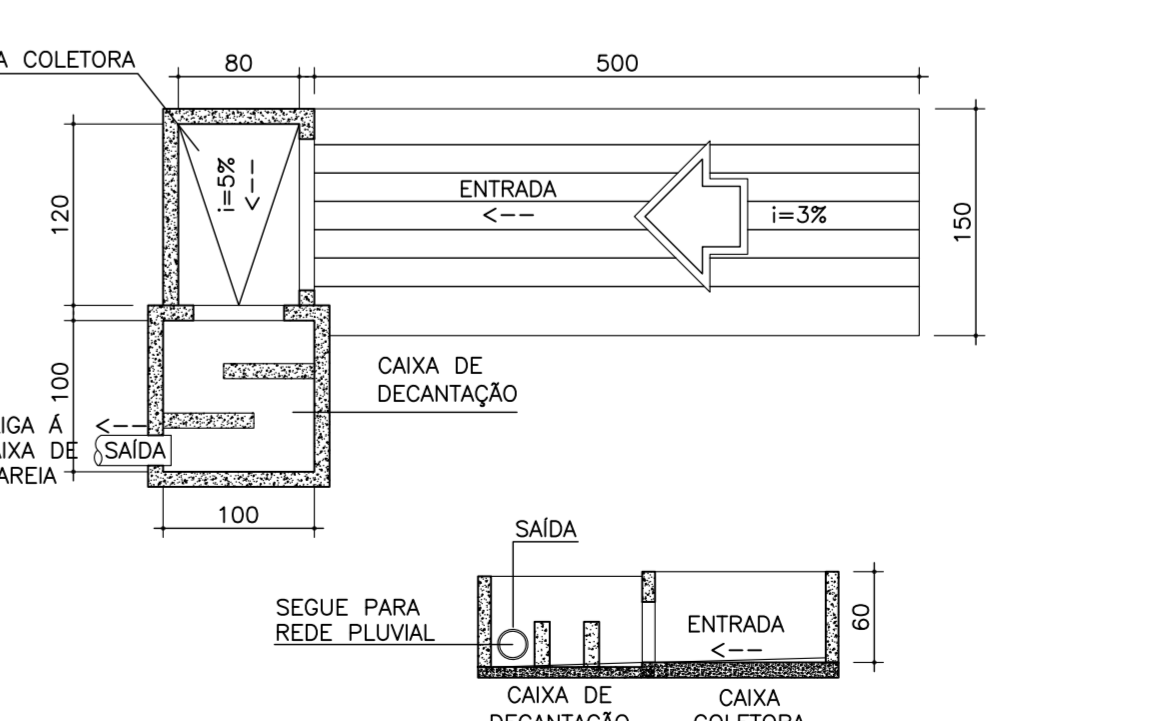

**DET. VALA DE DRENAGEM**  
SEM ESCALA

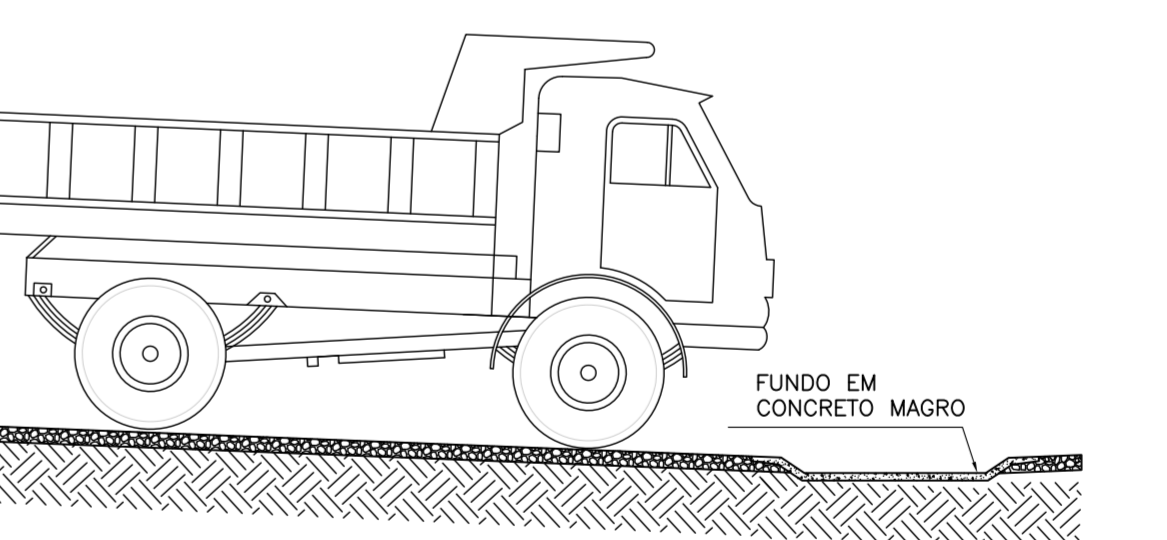


**DETALHE DO ACESSO DE CAMINHÕES E DA DECANTAÇÃO**  
SEM ESCALA

**LEGENDA PLANTA BAIXA**

	ÁREA NÃO EDIFICANTE CONFORME LC Nº 551/19
	ÁREA VERDE DE LAZER (BOSQUE CAMINHADAS. VEGETAÇÃO EXISTENTE A SER MANTIDA)
	VALA DE CONTENÇÃO E CARREAMENTO DO SOLO
	NTPL=NÍVEL TERRAPLANAGEM
	NPAV=NÍVEL PAVIMENTAÇÃO/PISO FINAL

- PROCEDIMENTOS E CONSIDERAÇÕES:**
- AS COTAS APRESENTADAS SÃO GREDE DE TERRAPLANAGEM.
  - PREPARAR O LOCAL DE ACESSO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E PESSOAS, EM LOCAL DE MENOR MOVIMENTO. PREPARAR UM TRECHO ENSABRADO, QUE SERÁ ÚTIL NA LIMPEZA DE PNEUS DE CAMINHÕES, VERIFICAÇÕES DE ENTRADA E SAÍDA E ENLONAMENTO.
  - FINALIZAR OS TRABALHOS DE ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO DE LEITO, FORMAÇÃO DE BASE/SUB-BASE PARA A PAVIMENTAÇÃO FINAL DO ACESSO, SE HOUVER.
  - LIMPEZA E POSSÍVEIS REPAROS NA VIA PÚBLICA PROVENIENTES DOS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM SÃO DE ÚNICA E EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO EXECUTOR.
  - ESTÁ SENDO CONSIDERADO PARA O NÍVEL DE TERRENO TERRAPLENADO UM DESCONTO EQUIVALENTE AS CAMADAS DE PAVIMENTAÇÃO EM RELAÇÃO AO NÍVEL DE PISO INDICADO EM PROJETO ARQUITETÔNICO.
  - O SISTEMA DE CONTENÇÃO E CARREAMENTO DEVE PERMANECER NO TERRENO ATÉ PLENA COBERTURA DO MATERIAL DE TERRAPLANAGEM.
  - LIMPEZA E POSSÍVEIS REPAROS NA VIA PÚBLICA PROVENIENTES DOS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM SÃO DE ÚNICA E EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO EXECUTOR.

CONFORME IN 06/SEMA/TERRAPLANAGEM:  
É VEDADA A COMERCIALIZAÇÃO DO MATERIAL EXCEDENTE DE CORTES (PORTARIA DNPV 441/08) E VEDADO A DEPOSIÇÃO DO MATERIAL EXCEDENTE EM TERRENOS DE TERCEIROS EXCETO EM ÁREAS PÚBLICAS MEDIANTE CERTIDÃO DE DOAÇÃO EXPEDIDA PELO ÓRGÃO PÚBLICO OU EM ATERRIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LEGALIZADOS.  
É VEDADO O ATERRO SOBRE A CAMADA DE SOLO ORGÂNICO, A QUAL DEVE SER RETIRADA E RESERVADA PARA POSTERIOR USO OU SER DISPOSTO EM LOCAL ADEQUADO.



 <b>JULIANO PERAZZOLI</b> Eng. Civil CREA/RSC 055.296-7		 <b>HACASA ADMINISTRAÇÃO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A</b> CNPJ: 83.796.284/0001-00	
--	--	--	--

REV.	DESCRIÇÃO	DATA	RESP.
D	REVISÃO FAIXA NÃO EDIFICANTE	18/08/2020	THAISE
C	REVISÃO 2P	10/08/2020	THAISE
B	ADEQUAÇÃO PARECER SAMA	02/07/2020	THAISE
A	EMISSION INICIAL	07/10/2019	THAISE

OBRA:  
**RES. RUA PRESIDENTE PRUDENTE DE MORAES**

ENDEREÇO:  
**RUA PRES. PRUDENTE DE MORAES, Nº850 - SANTO ANTÔNIO - JOINVILLE/SC**

PROJETO:  
**CONTENÇÃO E CARREAMENTO DO SOLO**

Nº PROJETO:  
**012-18-CAR**

DESCRIÇÃO:  
**CONTENÇÃO E CARREAMENTO DO SOLO**

ESCALA INDICADA:  
**01/01**

DATA:  
**07/10/2019**

DESENHO:  
**THAISE**

**2P ENGENHARIA**

RESPONSÁVEL TÉCNICO:  
 ENG. CIVIL: JULIANO PERAZZOLI CREA 055.296-7  
 ENG. CIVIL: THAISE C. DE SOUZA CREA 127.378-8  
 ENG. ELETRICISTA: THIAGO L. MÜLLER CREA 119.043-2

RUA PRES. PRUDENTE DE MORAES, 673, SALA 01, BAIRRO SANTO ANTÔNIO, 89.218-000 JOINVILLE/SC (47) 3028-8268  
 www.2penharia.com.br 2p@2penharia.com.br
