




Relatório de Vistoria na Cobertura da Arena Joinville

Em inspeção realizada na arquibancada coberta da Arena Joinville, foi verificada a substituição dos antigos tirantes por cabos de aço galvanizados, esticadores e clips para atuarem com elementos de distribuição de cargas geradas pela ação do vento em toda a estrutura metálica da cobertura.

Portanto, a arquibancada coberta da Arena Joinville, poderá ser liberada ao público.

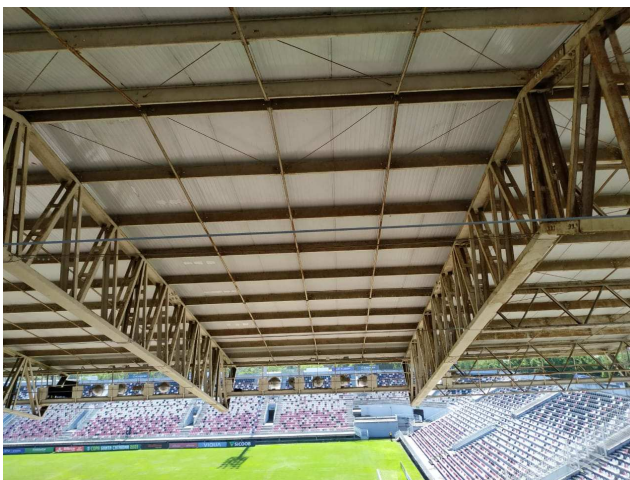

Joinville, 26/10/2021


Antonio Edival Pereira
Coord. Reg. de Defesa Civil
Matricula: 917149-5
