CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

PRODUTO	AÇÕES	DIA INÍCIO	DIA FINAL	PRAZO EXECUÇÃO (DIAS CORRIDOS)
1. Estudo Ambiental Simplificado (EAS)	Estudos preliminares	0	21	21
	Elaboração EAS	21	60	39
	Análise CAF	22/61	24/63	3
	Revisão	25/64	27/66	3
	Reanálise CAF	28/67	30/69	3
	Aceite pela CAF	31/70	33/72	3
Licença Ambiental Prévia (LAP)	Juntada de documentos + Protocolo órgão ambiental	73	73	1
	Análise órgão ambiental	73	102	30
	Complementação, se necessário	103	117	15
	Reanálise órgão ambiental	118	132	15
	Aprovação órgão ambiental	133	135	3
2. Projeto Executivo de Drenagem	Elaboração	34	63	30
	Análise CAF	64	72	9
	Revisão	73	87	15
	Reanálise CAF	88	93	6
	Aceite pela CAF	94	96	3
3. Planos e Programas Ambientais, detalhados a nível executivo	Elaboração	109	123	15
	Análise CAF	124	126	3
	Revisão	127	129	3
	Reanálise CAF	130	132	3
	Aceite pela CAF	133	135	3
Licença Ambiental de Instalação (LAI)	Juntada de documentos + Protocolo órgão ambiental	136	136	1
	Análise órgão ambiental	136	180	45
	Complementação, se necessário	181	189	9
	Reanálise órgão ambiental	190	204	15
	Aprovação órgão ambiental	205	207	3
Obra de drenagem projetada	Execução	208	237	30
	Verificação pela PMJ	238	240	3
	Correções e refazimentos	241	246	6
	Aceite pela PMJ	247	249	3
4. Relatório técnico + relatório fotográfico.	Elaboração	208	252	45
	Análise CAF	253	255	3
	Revisão	256	258	3
	Reanálise CAF	259	260	2
	Aceite pela CAF	261	261	1
Licença Ambiental de Operação	Juntada de documentos + Protocolo órgão ambiental	262	262	1
	Análise órgão ambiental	262	282	20
	Complementação, se necessário	283	288	6
	Reanálise órgão ambiental	289	297	9
	Aprovação órgão ambiental	298	300	3

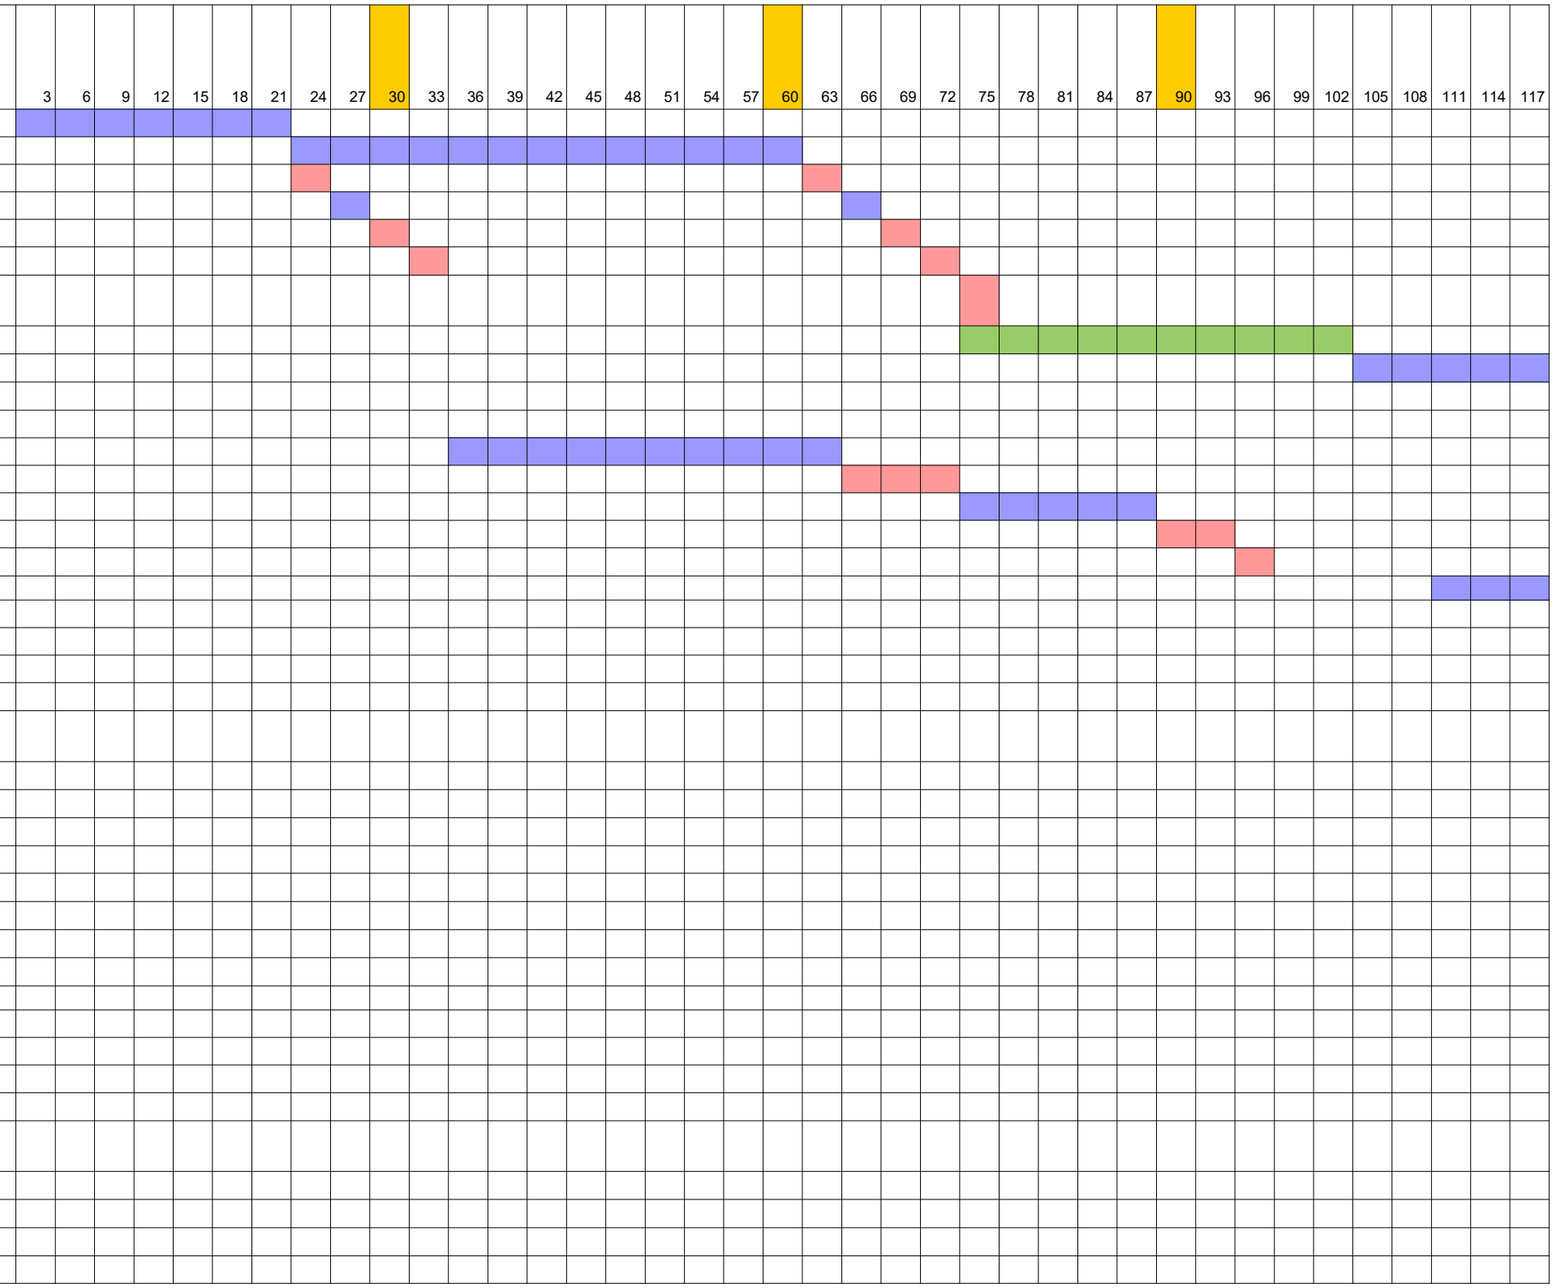

LEGENDA

Atribuição da Contratada

Atribuição da PMJ

Atribuição do órgão ambiental

Anexo IV - Cronograma de Execução dos Serviços (0014617085) SEI 022.0.311166-0 / pg. 1

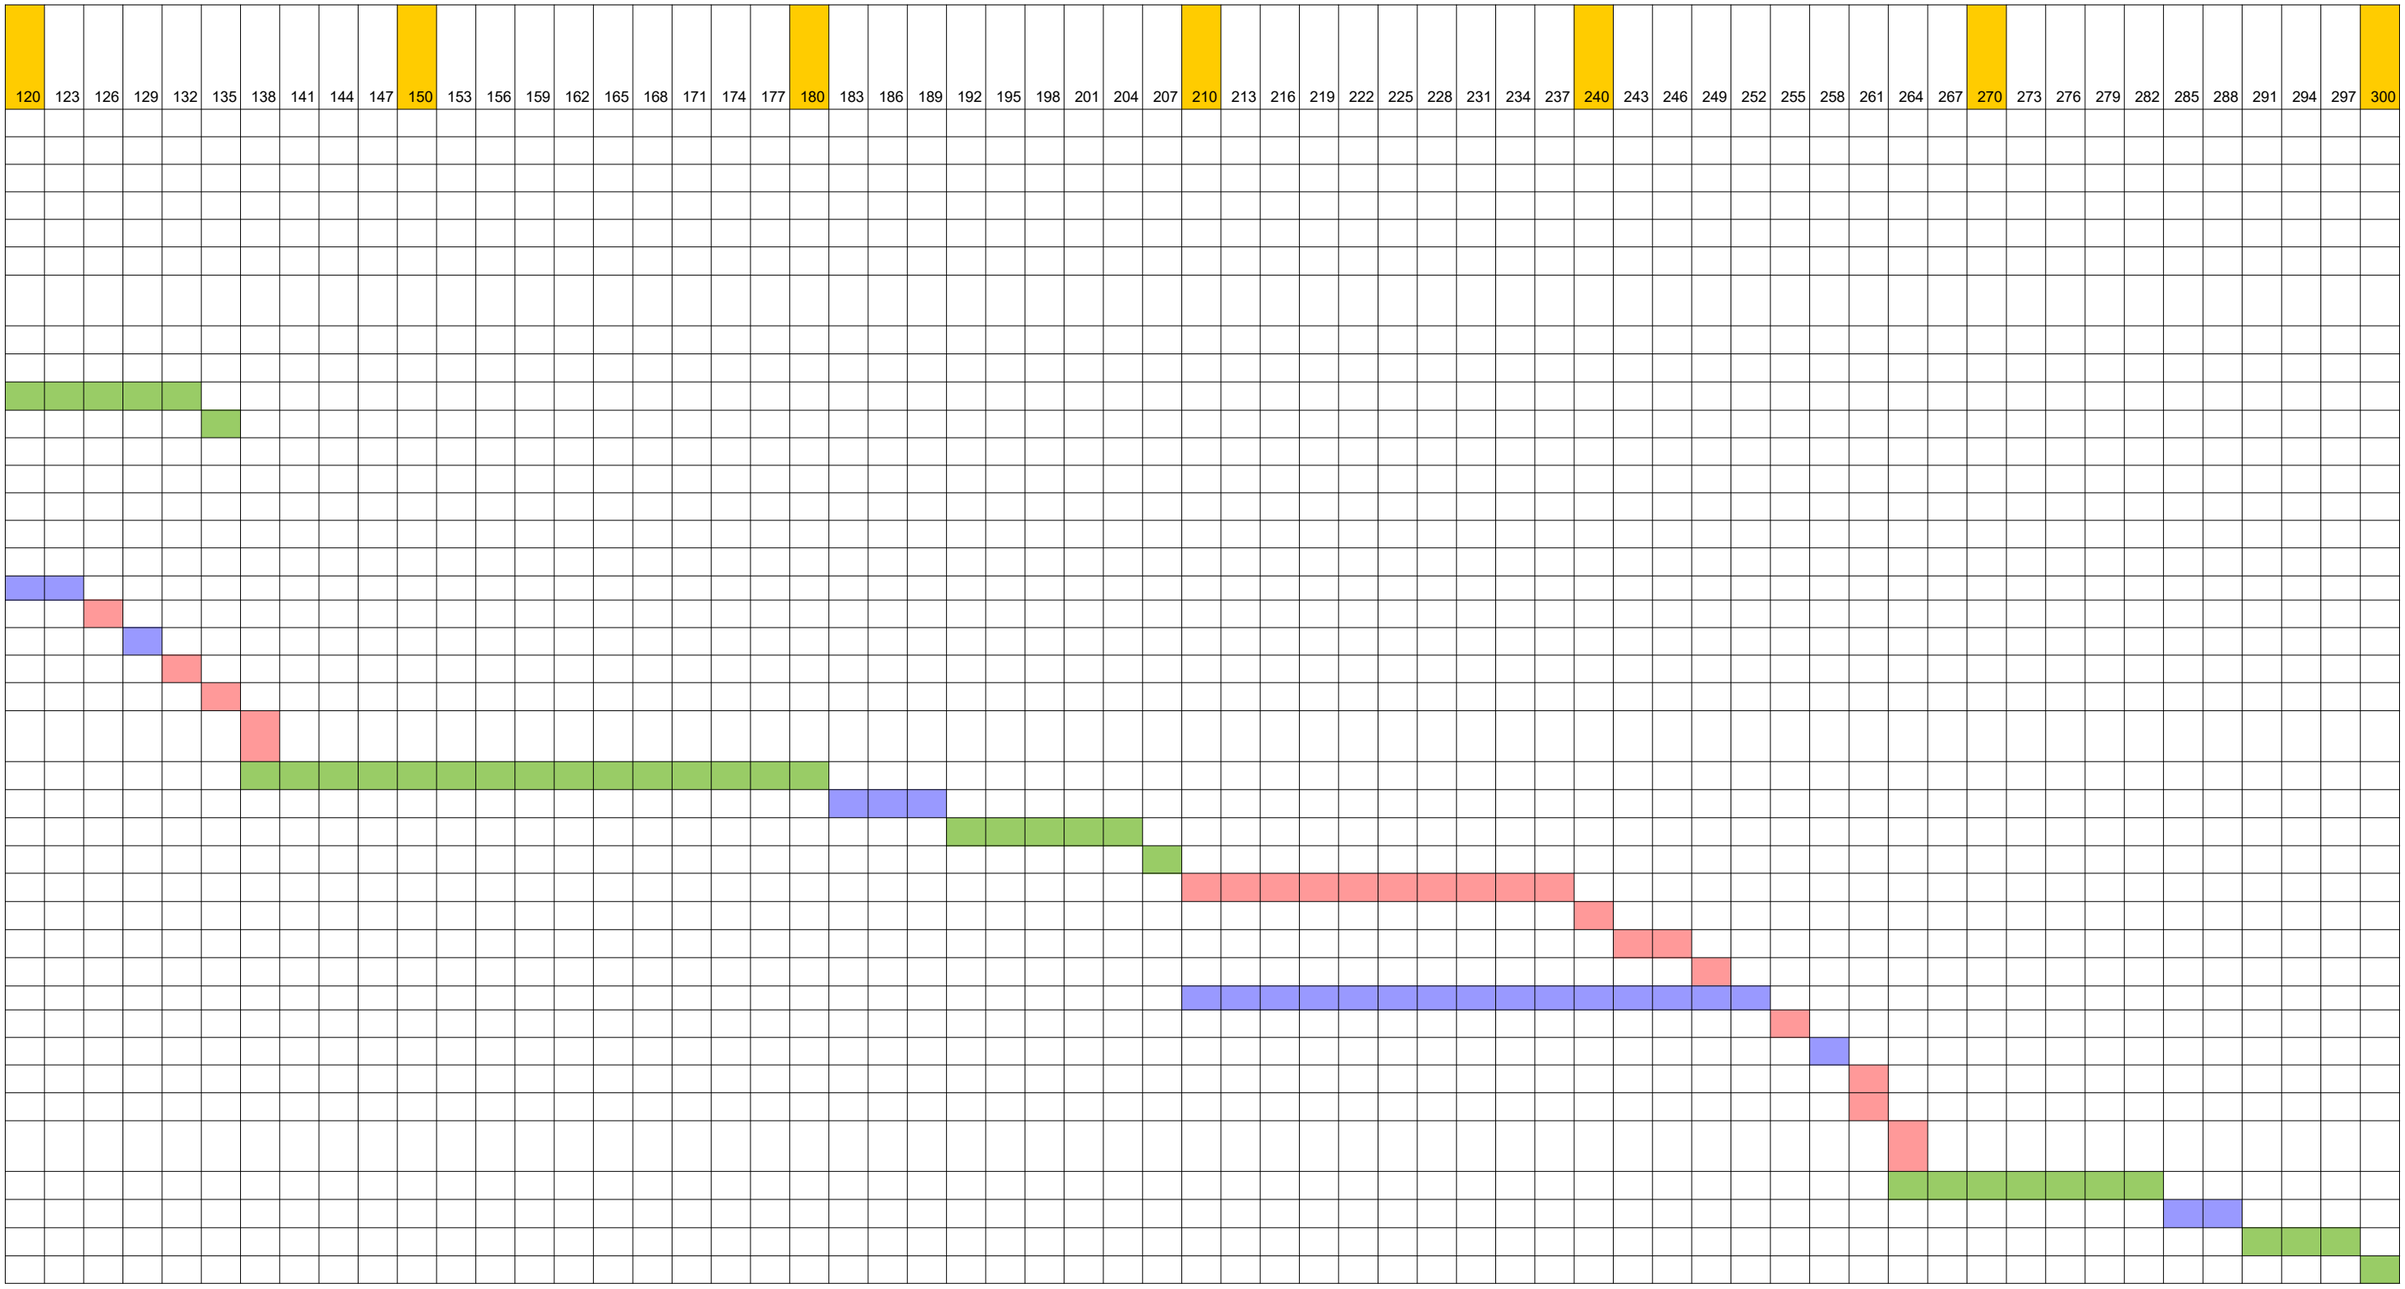

Anexo IV - Cronograma de Execução de Serviços (001417852) SEI 0024.015986/2022-22 / pg. 2
Anexo I - Cronograma de Execução de Serviços SEI 0024.015986/2022-22.0.311166-0 / pg. 2
